

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 1 de 10

Código: Planeación: PCDI-023-001-013

AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POAI DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA – PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2024.

Fecha: 16 de julio de 2024

Elaborado por: Ana María Peña Gutiérrez – Profesional especializada participe de gremio – Oficina de Planeación

OBJETIVO :

Detallar la ejecución a corte de 30 de junio de cada uno de los proyectos de inversión aprobados para la vigencia 2024 de la Institución.

CONTENIDO:

El Plan Operativo Anual de Inversiones POAI fue aprobado por la Junta Directiva de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, mediante Acuerdo No. 002 del 31 de enero del 2024, por un valor de **\$85.099.255.625** millones.

Este informe semestral se ha consolidado por parte de la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional, con base en las ejecuciones del presupuesto de inversión realizadas por cada una de las dependencias responsables, quienes allegan la respectiva información.

Los rubros de inversión por proyecto ejecutados para la vigencia 2024, se detallan a continuación:

PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS	RUBRO PRESUPUESTAL	\$ PROYECTADO PARA LA VIGENCIA	FUENTES DE FINANCIACIÓN		\$ COMPROMETIDO 30/06/2024
			RECURSOS PROPIOS	OTROS GESTION	
1.Construcción de la Terminación de la Torre Materno Infantil y de Alta Complejidad de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva Departamento del Huila.	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 66.282.000.000	\$ 18.282.000.000	\$ 48.000.000.000	\$66.283.579.095
2.Construcción de la unidad de medicina nuclear de la E.S.E H.U.H.M. P, Departamento del Huila	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 500	\$ 500		\$ -
3.Construcción de la unidad neuropsiquiátrica y del comportamiento de la E.S.E hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 500	\$ 500		\$ -
4."Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva".	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 9.766.501.087	\$ 2.057.535.795	\$ 7.077.060.950	\$9.992.708.703,58
5.Adquisición lote para edificio de parqueaderos	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 1.000	\$ 1.000		\$ -

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 2 de 10

6.Construcción de bodega de archivo	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 2.000	\$ 2.000		\$ -
7.Diseño de sistema detección de incendios	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 170.000.000	\$ 170.000.000		\$250.000.000
8.Estudio de patología del área de Unidad Mental	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 231.000.000	\$ 231.000.000		\$145.000.000
9.Estudio del catastro de redes del sistema de oxígeno y aire medicinal	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000		\$ -
10.Construcción de central de esterilización	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 2.000	\$ 2.000		\$ -
11.Adecuación de sala Angiógrafo, salas de recuperación y hall de acceso	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 260.581.788	\$ 260.581.788		\$ -
12.Construcción de la red de detección y extinción de incendios del sistema de emergencias de la E.S.E Hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 2.000	\$ 2.000		\$ -
13.Construcción de bodega de activos fijos	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 2.000	\$ 2.000		\$ -
14.Diseño de sede para consulta externa (25 consultorios)	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 2.000	\$ 2.000		\$ -
15.Adecuación sala de espera primer piso, diseño y construcción de estructura en área de capilla dándole manejo a redes hidrosanitarias y eléctricas	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 3.000	\$ 3.000		\$ -
16.Reforzamiento estructural módulo 3.	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 3.318.073.733	\$ 3.318.073.733		\$3.170.665.610
17.Dotación de equipo industrial o comercial para acondicionamiento de aire y calefacción.	2.3.2.01.01.003.01.06	\$ 123.020.566	\$ 123.020.600		\$ -
18.Dotación de centro de datos para E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva con estándares de alta disponibilidad, escalamiento y mejoramiento de los servicios tic, fase IV" - EQUIPO INDUSTRIAL O COMERCIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y CALEFACCIÓN	2.3.2.01.01.003.01.06	\$ 200	\$ 200		\$ -
19.Dotación de centro de datos para ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva con estándares de alta disponibilidad, escalamiento y mejoramiento de los servicios tic, fase IV." EQUIPOS Y MÁQUINAS PARA TELEPROCESOS	2.3.2.01.01.003.03.02	\$ 200	\$ 200		\$ -
20.Dotación de equipos y máquinas para teleprocesos.	2.3.2.01.01.003.03.02	\$ 108.560.000	\$ 108.560.000		\$ -
21.Adquisición de infraestructura tecnológica para control y seguimiento de acceso a los usuarios y personal que labora en las instalaciones de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	\$ 50	\$ 50		\$ -

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 3 de 10

22.Desarrollo a la medida de un software (análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y soporte) para los sistemas CORE (HIS, ERP) en una plataforma de microservicios y contenedores para la E.S.E HUHMP, dpto. del Huila, fase II: historia clínica, gestión de procesos de negocio (BPM)*, plataforma tecnológica.	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	\$ 50	\$ 50		\$ -
23.Adquisición de Paquetes de Software.	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	\$ 100	\$ 100		\$ -
24.Dotación de centro de datos para ese hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva con estándares de alta disponibilidad, escalamiento y mejoramiento de los servicios tic, fase IV". APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO.	2.3.2.01.01.003.04.02	\$ 400	\$ 400		\$ -
25.Adquisición y reposición de equipos biomédicos necesarios para la E.S.E para el cumplimiento al sistema único de habilitación	2.3.2.01.01.003.06.01	\$ 122.523.002	\$ 122.523.002		\$ 22.332.873
26.Dotación de equipos biomédicos de alta tecnología para la unidad de cuidado intensivo neonatal del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 1.000	\$ 1.000		\$ -
27.Dotación de equipos biomédicos de alta tecnología para el servicio de urgencias de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 2.000	\$ 2.000		\$ -
28.Dotación de equipos de apoyo para la central de esterilización del hospital	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 1.000	\$ 1.000		\$ -
29.Dotación de equipos biomédicos para la torre materno infantil de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 1.000	\$ 1.000		\$ -
30.Dotación de equipos biomédicos para terapia ECMO en la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 1.000	\$ 1.000		\$ -
31.Adquisición de gammacamara para la unidad oncológica de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 1.000	\$ 1.000		\$ -
32.Dotación unidad medicina nuclear de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 1.000	\$ 1.000		\$ -
33.Renovación de un Angiógrafo Para la unidad CARDIOVASCULAR, cofinanciado con recursos de Minsalud - Recursos Propios	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 4.616.971.415	\$ 1.200.000.000	\$ 3.416.971.415	\$ 4.462.976.000
TOTALES		\$ 85.099.255.591	\$ 25.973.318.918	\$ 58.494.032.365	\$ 84.327.262.281,58

A continuación, se presenta grafica de ejecución presupuestal Plan Operativo Anual de Inversiones Primer Semestre 2024:

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878


Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 4 de 10

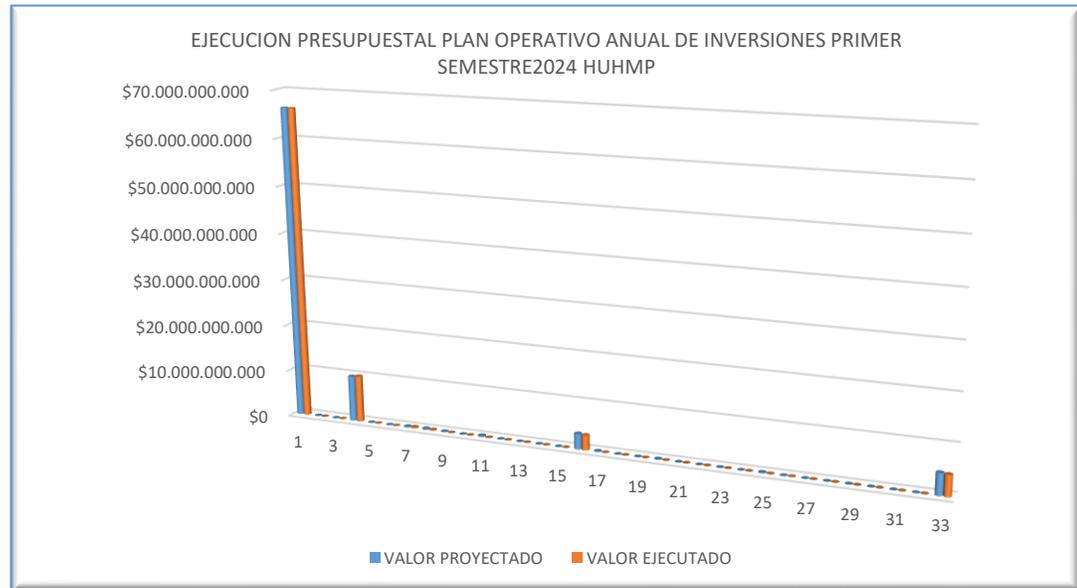

Fuente: Elaboración propia

1. Frente a la ejecución de los recursos del proyecto denominado “**Construcción de la Terminación de la Torre Materno Infantil y de Alta Complejidad de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva Departamento del Huila.**”, por valor de **\$66.282.000.000**, el Subgerente Administrativo Dr. Oscar Uriel Bravo Díaz informó mediante correo electrónico de fecha 08 de julio de 2024 que:

- Se suscribió Contrato de Obra No. 119 del 07 de marzo de 2024, con Consorcio Construo Materno, inicio el 09 de mayo de 2024, por valor de \$62.845.147.244 IVA incluido, con el objeto de Construcción de la Terminación de la Torre Materno Infantil y de alta complejidad de la ESE, a corte de 30 de junio de 2024 se realizó pago de anticipo del 30% por valor de \$ 18.853.544.173.
- Se suscribió Contrato de Interventoría No. 146 del 25 de marzo de 2024, con Unión Temporal Inter TMI, inicio el 09 de mayo de 2024, por valor de \$3.332.431.851, con el objeto de Interventoría al contrato que se suscriba para la obra construcción y terminación de la Torre Materno Infantil y de alta complejidad de la ESE.
- Se suscribió el Contrato de Consultoría No. 165 de 2024, con VINCI PROJECTS SAS, con el objeto de Consultoría para el apoyo a la supervisión técnica al contrato de obra No. 119 de 2024 suscrito para la construcción de la terminación de la torre materno

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita: 018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 5 de 10

infantil y de alta complejidad de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, por valor de \$98.000.000, con corte a 30 de junio la ejecución es del 0%.

- Se suscribió Orden de Servicio 439-2024 por valor de \$8.000.000, para la impresión de planos, fotoplanos, escaneo, ploteo, digitalización de planos de la E.S.E.

Por lo anterior el porcentaje de ejecución de este proyecto, de acuerdo al compromiso del rubro de inversión corresponde a un 100%.

2.En cuanto a la ejecución de los recursos asignados al proyecto “Construcción de la unidad de medicina nuclear de la E.S.E H.U.H.M.P Departamento del Huila.”, el Subgerente Administrativo Dr. Oscar Uriel Bravo Díaz informo mediante correo electrónico de fecha 08 de julio de 2024 que dicho proyecto se encuentra sin iniciar, por lo tanto, la ejecución de este proyecto es de 0%.

3.En relación a la ejecución del proyecto “Construcción de la unidad neuropsiquiátrica y del comportamiento de la E.S.E hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.” la Subgerencia Administrativa informa mediante correo electrónico de fecha 08 de julio de 2024 que dicho proyecto se encuentra pendiente de revisar y hacer actualización del proyecto, ya que este está aprobado desde el año 2018, por tal razón, la ejecución de este proyecto es de 0%.

4.Con respecto a la ejecución del proyecto “**Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva**”, el Subgerente Administrativo Dr. Oscar Uriel Bravo Díaz informó mediante correo electrónico de fecha 08 de julio de 2024 que:

- Se suscribió el Contrato de Obra No. 164 de 2024 para la Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias de la ESE, por valor de \$9.480.335.068,58., con acta de inicio el 14 de mayo de 2024, a corte de 30 de junio de 2024 se tiene un valor ejecutado de \$2.844.100.521.
- Se suscribió el Contrato No. 166 de 2024 para la interventoría al contrato que se suscriba para la ampliación y remodelación del servicio de urgencias, por valor de \$512.373.635. Con acta de inicio del 14 de mayo de 2024.

Por lo anterior el porcentaje de ejecución de este proyecto, de acuerdo al compromiso del rubro de inversión corresponde a un 102%.

5.En cuanto a la ejecución del proyecto “**Adquisición lote para edificio de parqueaderos**”, la Subgerencia Administrativa indica que se encuentra pendiente, actualmente se cuenta con el avalúo del lote, por ende, la ejecución del proyecto se encuentra en 0%.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 6 de 10

6. Acerca del proyecto “**Construcción de bodega de archivo**”, la Subgerencia Administrativa indica mediante correo electrónico de fecha 08 de julio de 2024 que se encuentra sin iniciar, por consiguiente, la ejecución del proyecto se encuentra en 0%.

7. Frente a la ejecución del proyecto “**Diseño de sistema detección de incendios**”, la Subgerencia Administrativa indica mediante correo electrónico que, se suscribió el contrato de Consultoría No. 163 de 2024, con Building to live S.A.S por valor de \$250.000.000, con el objeto de Consultoría para la elaboración del diagnóstico, diseño y presupuesto del sistema de equipos para detección y alarma de incendios de la torre principal, módulo tres y demás áreas de la ESE, así como el sistema de extinción de incendios para las áreas de cancerología, áreas de expansión, bodega, gases medicinales, administración, y demás áreas que no posean dicho diseño de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, a corte de 30 de junio de 2024 se tiene un valor ejecutado de 75.000.000, por ende, la ejecución del proyecto, de acuerdo al compromiso del rubro de inversión corresponde al 147%.

8. En relación a la ejecución del proyecto “**Estudio de patología del área de Unidad Mental**”, el Subgerente Administrativo Dr. Oscar Uriel Bravo Díaz informó mediante correo electrónico de fecha 08 de julio de 2024 que se suscribió el Contrato de Consultoría No. 168 de 2024, con el objeto de la Consultoría para el estudio de patología estructural del edificio de la Unidad Mental de la ESE, por valor de \$145.000.000 IVA incluido, a corte de 30 de junio de 2024 la ejecución del proyecto, de acuerdo al compromiso del rubro de inversión corresponde al 63%.

9. El proyecto “**Estudio del catastro de redes del sistema de oxígeno y aire medicinal**”, de acuerdo a lo informado por la Subgerencia Administrativa se encuentra sin iniciar, por cuanto su ejecución a 30 de junio de 2024 es del 0%.

10. En cuanto a el proyecto “**Construcción de central de esterilización**”, la Subgerencia Administrativa indica mediante correo electrónico de fecha 08 de julio de 2024 que se encuentra sin iniciar, por lo tanto, la ejecución del proyecto se encuentra en 0%.

11. Frente a la ejecución del proyecto “**Adecuación de sala Angiógrafo, salas de recuperación y hall de acceso**”, de acuerdo a lo informado por la Subgerencia Administrativa, se han ejecutado este proyecto con recursos del contrato de mantenimiento de la infraestructura de la E.S.E., por consiguiente, la ejecución del proyecto se encuentra en 0%.

12. En relación a la ejecución del proyecto “**Construcción de la red de detección y extinción de incendios del sistema de emergencias de la E.S.E Hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva**”, la Subgerencia Administrativa indica mediante correo electrónico de fecha 08 de julio de 2024 que se encuentra sin iniciar, por lo tanto, la ejecución del proyecto se encuentra en 0%.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita: 018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 7 de 10

13. La ejecución del proyecto “**Construcción de bodega de activos fijos**”, se encuentra en 0%, de acuerdo a la información remitida por la Subgerencia Administrativa.

14. Con respecto a la ejecución del proyecto “**Diseño de sede para consulta externa (25 consultorios)**”, la Subgerencia Administrativa informa que el proyecto se encuentra sin iniciar, por ende, el porcentaje de ejecución es del 0%.

15. Frente a la ejecución del proyecto “**Adecuación sala de espera primer piso, diseño y construcción de estructura en área de capilla dándole manejo a redes hidrosanitarias y eléctricas**”, informa la Subgerencia Administrativa que el proyecto está sin iniciar, por lo cual, su ejecución es del 0%.

16. En cuanto a la ejecución del proyecto “**Reforzamiento estructural módulo 3**”, la Subgerencia Administrativa indica mediante correo electrónico de fecha 08 de julio de 2024 que:

- Se suscribió el Contrato de Obra No. 194 de 2024, con Unión Temporal Reforzamiento Hospital, con el objeto de Construcción y Reforzamiento Estructural del Módulo 3 de la ESE., por valor de \$2.944.257.252. Pendiente de dar inicio.
- Se suscribió el Contrato de Interventoría No. 197 de 2024, con Consorcio M&S Interventoría, con el objeto de contratar la interventoría al contrato que se suscriba para la obra construcción y reforzamiento estructural del módulo 3 de la ESE, por valor de \$226.408.358. Pendiente de dar inicio.

A corte de 30 de junio de 2024, dicho proyecto tiene una ejecución, de acuerdo al compromiso del rubro de inversión del 96%.

17. La ejecución del proyecto “**Dotación de equipo industrial o comercial para acondicionamiento de aire y calefacción**”, se encuentra en 0%, toda vez que dicho proyecto se encuentra sin iniciar, información suministrada por la Sugerencia Administrativa.

En cuanto a la ejecución de los proyectos a cargo de la Ing. Adriana María Lizcano Losada – Jefe de Oficina Asesora de Sistemas de Información, mediante correo electrónico de fecha 08 de julio de 2024, informa:

18. Proyecto “**Dotación de centro de datos para E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva con estándares de alta disponibilidad, escalamiento y mejoramiento de los servicios tic, fase IV**” – **EQUIPO INDUSTRIAL O COMERCIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y CALEFACCIÓN**”, ejecución del 0%, proyecto se encuentra en formulación para acceder a recursos de OCAD.

19. Proyecto “**Dotación de centro de datos para ese Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva con estándares de alta disponibilidad, escalamiento y**

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita: 018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 8 de 10

mejoramiento de los servicios tic, fase IV.” EQUIPOS Y MÁQUINAS PARA TELEPROCESOS”, ejecución del 0%, proyecto se encuentra en formulación para acceder a recursos de OCAD.

20. Proyecto **“Dotación de equipos y máquinas para teleprocesos”**, no se ejecutado, se encuentra en proceso de cotización.

21. Proyecto **“Adquisición de infraestructura tecnológica para control y seguimiento de acceso a los usuarios y personal que labora en las instalaciones de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva”**, ejecución del 0%.

22. Proyecto **“Desarrollo a la medida de un software (análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y soporte) para los sistemas core (his, erp) en una plataforma de microservicios y contenedores para la E.S.E HUHMP, dpto. del Huila, fase II: historia clínica, gestión de procesos de negocio (bpm)”, plataforma tecnológica**”, no se ha ejecutado, por cuanto no tiene recursos asignados.

23. Proyecto **“Adquisición de Paquetes de Software”**, ejecución del 0%.

24. Proyecto **“Dotación de centro de datos para ese hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva con estándares de alta disponibilidad, escalamiento y mejoramiento de los servicios tic, fase IV”. APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO**”, no se ha ejecutado.

Frente a los proyectos de dotación de equipos biomédicos a cargo de la Ingeniera Marlen Medellín Rincón – Profesional Universitaria de Recursos Físicos, mediante oficio de fecha 05 de julio de 2024 informa:

25. Proyecto **“Adquisición y reposición de equipos biomédicos necesarios para la E.S.E para el cumplimiento al sistema único de habilitación”**:

- Se suscribió el Contrato de Compraventa No. 143 de 2024, con Fleming Biomédica SAS, con el objeto de la compra de camillas de transporte y atriles portabomba para la ESE, por valor de \$199.592.417 de los cuales por el rubro de inversión se comprometieron \$17.868.350.
- Se suscribió la Orden No. 00000130, con Subiecom LTDA, para la Compra de un agitador de mazzini para la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, total comprometido \$ 4.464.523.

A corte de 30 de junio de 2024 la ejecución del proyecto, de acuerdo al compromiso del rubro de inversión corresponde al 18%.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 9 de 10

26. Proyecto “**Dotación de equipos biomédicos de alta tecnología para la unidad de cuidado intensivo neonatal del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva**”, se encuentra en proceso de actualización, ya que el Ministerio de Protección Social lo devolvió, por tal razón su ejecución es del 0%.

27. Proyecto “**Dotación de equipos biomédicos de alta tecnología para el servicio de urgencias de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva**”, se encuentra en proceso de actualización, ya que el Ministerio de Protección Social lo devolvió, por tal razón su ejecución es del 0%.

28. Proyecto “**Dotación de equipos de apoyo para la central de esterilización del Hospital**”, sin iniciar, ejecución del 0%.

29. Proyecto “**Dotación de equipos biomédicos para la torre materno infantil de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva**”, se encuentra en elaboración, su ejecución a 30 de junio de 2024 es del 0%.

30. Proyecto “**Dotación de equipos biomédicos para terapia ECMO en la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva**”, sin iniciar, ejecución del 0%.

31. Proyecto “**Adquisición de gamma cámara para la unidad oncológica de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva**”, se encuentra sin iniciar, ejecución del 0%.

32. Proyecto “**Dotación unidad medicina nuclear de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva**”, se encuentra sin iniciar, ejecución del 0%.

33. Proyecto “**Renovación de un Angiógrafo Para la unidad CARDIOVASCULAR, cofinanciado con recursos de Minsalud - Recursos Propios**”, Se suscribió Contrato No. 091 de 2024 del 15 de febrero de 2024 por valor de \$4.462.976.000, con el objeto de adquisición de un Angiógrafo para renovación tecnológica de la ESE, con corte a 30 de junio se tiene un valor ejecutado de \$ 1.338.892.800, por lo tanto, el porcentaje de ejecución de este proyecto, de acuerdo al compromiso del rubro de inversión corresponde al 97%.

Verificando la información de los compromisos del rubro gastos de inversión remitido por la Oficina de Presupuesto, se puede evidenciar que la Oficina de Suministros celebró Orden de Compra de Activos Fijos No. 00134 del 12 de junio de 2024 con Johnson & Johnson Medtechh Colombia S.AS., cuyo objeto no se encuentra contemplado en el POAI de la presente vigencia y este comprometió el rubro de inversión en \$5.274.294.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 10 de 10

CONCLUSIONES:

Frente a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión de la Institución, encontramos que, con corte a 30 de junio de 2024, se presenta ejecución de los compromisos en el presupuesto de inversión por valor de \$84.327.262.281,58 millones, correspondiente al 99.1% del presupuesto aprobado el Plan Operativo Anual de Inversión 2024.

Se evidencia que se están comprometiendo recursos que no están contemplados en el POAI vigencia 2024, por lo cual se solicita a las áreas vinculadas en los procesos de contratación regirse exclusivamente a lo aprobado por Acuerdo por parte de la Junta Directiva.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda a las áreas vinculadas en los procesos de contratación regirse exclusivamente a lo aprobado por Acuerdo por parte de la Junta Directiva de la Institución, ya que se evidencia que se están comprometiendo recursos del rubro de gastos de inversión con adquisiciones que no se encuentran contempladas en el Plan Operativo Anual de Inversiones vigencia 2024.

Se solicita a los ejecutores del POAI informar a la Oficina Asesora de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional y la Oficina de Presupuesto, notificar cualquier trámite o modificación que se requiera realizar al rubro gastos de inversión.

Como se evidencia en el seguimiento presentado al POAI, a corte 30 de junio de 2024 se encuentran 26 proyectos sin iniciar, de los cuales 22 corresponden a iniciativas, las cuales se tienen contempladas para gestionar recursos con fuente de financiación externa, se sugiere respetuosamente para esta vigencia realizar el ajuste que considere la nueva administración.

ORIGINAL FIRMADO

MARLENY QUESADA LOSADA

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.

Proyecto: Ana María Peña Gutiérrez-Profesional Especializada participe de gremio.

Reviso: Marleny Quesada Losada jefe Oficina de planeación, Calidad y Desarrollo Institucional.

Anexos: (Acuerdo 0002 del 31 de enero de 2023)

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia
