

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 1 de 10

Código: Planeación: PCDI-023-001-002					
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POAI DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA – SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2024.					
Fecha: 16 de enero de 2025					
Elaborado por: Ana María Peña Gutiérrez – Profesional especializada partícipe de gremio – Oficina de Planeación					
OBJETIVO : Detallar la ejecución a corte de 31 de diciembre de cada uno de los proyectos de inversión aprobados para la vigencia 2024 de la Institución.					
CONTENIDO: El Plan Operativo Anual de Inversiones POAI fue aprobado por la Junta Directiva de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, mediante Acuerdo No. 002 del 31 de enero del 2024, por un valor de \$85.099.255.625 millones . Este informe semestral se ha consolidado por parte de la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional, con base en los reportes de seguimiento de ejecuciones del presupuesto de inversión realizado por cada una de las dependencias responsables, quienes allegan la respectiva información. Los rubros de inversión por proyecto ejecutados para la vigencia 2024, se detallan a continuación:					
PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS	RUBRO PRESUPUESTAL	\$ PROYECTADO PARA LA VIGENCIA	RECURSOS PROPIOS	OTROS GESTION	\$ EJECUTADO Compromiso de Ejecución vigencia
Construcción de la Terminación de la Torre Materno Infantil y de Alta Complejidad de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva Departamento del Huila.	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 86.282.000.000	\$ 18.282.000.000	\$ 48.000.000.000	\$ 66.283.579.095
Construcción de la unidad de medicina nuclear de la ESE H.U.H.M.P. Departamento del Huila	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 500	\$ 500		\$ -
Construcción de la unidad neuropsiquiátrica y del comportamiento de la E.S.E hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 500	\$ 500		\$ -

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita: 018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 2 de 10

"Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva".	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 9.766.501.087	\$ 2.057.535.795	\$ 7.077.060.950	\$ 9.992.708.703,58
Adquisición lote para edificio de parqueaderos	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 1.000	\$ 1.000		\$ -
Construcción de bodega de archivo	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 2.000	\$ 2.000		\$ -
Diseño de sistema detección de incendios	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 170.000.000	\$ 170.000.000		\$ 250.000.000
Estudio de patología del área de Unidad Mental	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 231.000.000	\$ 231.000.000		\$ 145.000.000
Estudio del catastro de redes del sistema de oxígeno y aire medicinal	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000		\$ 56.751.100
Construcción de central de esterilización	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 2.000	\$ 2.000		\$ -
Adecuación de sala Angiógrafo, salas de recuperación y hall de acceso	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 260.581.788	\$ 260.581.788		\$ -
Construcción de la red de detección y extinción de incendios del sistema de emergencias de la E.S.E Hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 2.000	\$ 2.000		\$ -
Construcción de bodega de activos fijos	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 2.000	\$ 2.000		\$ -
Diseño de sede para consulta externa (25 consultorios)	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 2.000	\$ 2.000		\$ -
Adecuación sala de espera primer piso, diseño y construcción de estructura en área de capilla dándole manejo a redes hidrosanitarias y eléctricas	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 3.000	\$ 3.000		\$ -
Reforzamiento estructural módulo 3.	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 3.318.073.733	\$ 3.318.073.733		\$ 3.170.665.610
Dotación de equipo industrial o comercial para acondicionamiento de aire y calefacción.	2.3.2.01.01.003.01.06	\$ 123.020.566	\$ 123.020.600		\$ -
Dotación de centro de datos para E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva con estándares de alta disponibilidad, escalamiento y mejoramiento de los servicios tic, fase IV" - EQUIPO INDUSTRIAL O COMERCIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y CALEFACCIÓN	2.3.2.01.01.003.01.06	\$ 200	\$ 200	\$ 108.561.000	\$ -
Dotación de centro de datos para la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva con estándares de alta disponibilidad, escalamiento y mejoramiento de los servicios tic, fase IV." EQUIPOS Y MÁQUINAS PARA TELEPROCESOS	2.3.2.01.01.003.03.02	\$ 200	\$ 200		\$ -
Dotación de equipos y máquinas para teleprocesos.	2.3.2.01.01.003.03.02	\$ 108.560.000	\$ 108.560.000		\$ 103.784.598

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO		FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME		VERSIÓN: 02
			CODIGO: GD-SGI-F-001A
			PAGINA: 3 de 10

Adquisición de infraestructura tecnológica para control y seguimiento de acceso a los usuarios y personal que labora en las instalaciones de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	\$ 50	\$ 50		\$ -
Desarrollo a la medida de un software (análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y soporte) para los sistemas CORE (HIS, ERP) en una plataforma de microservicios y contenedores para la E.S.E HUHMP, dpto. del Huila, fase II: historia clínica, gestión de procesos de negocio (BPM)", plataforma tecnológica.	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	\$ 50	\$ 50		\$ -
Adquisición de Paquetes de Software.	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	\$ 100	\$ 100		\$ -
Dotación de centro de datos para ese hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva con estándares de alta disponibilidad, escalamiento y mejoramiento de los servicios tic, fase IV" APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO.	2.3.2.01.01.003.04.02	\$ 400	\$ 400		\$ -
Adquisición y reposición de equipos biomédicos necesarios para la E.S.E para el cumplimiento al sistema único de habilitación	2.3.2.01.01.003.06.01	\$ 122.523.002	\$ 122.523.002		\$ 78.110.553
Dotación de equipos biomédicos de alta tecnología para la unidad de cuidado intensivo neonatal del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 1.000	\$ 1.000		\$ -
Dotación de equipos biomédicos de alta tecnología para el servicio de urgencias de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 2.000	\$ 2.000		\$ -
Dotación de equipos de apoyo para la central de esterilización del hospital	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 1.000	\$ 1.000		\$ -
Dotación de equipos biomédicos para la torre materno infantil de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 1.000	\$ 1.000		\$ -
Dotación de equipos biomédicos para terapia ECMO en la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 1.000	\$ 1.000		\$ -
Adquisición de gammacamara para la unidad oncológica de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 1.000	\$ 1.000		\$ -

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva


www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO Empresa Social del Estado	FORMATO		FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME		VERSIÓN: 02
			CODIGO: GD-SGI-F-001A
			PAGINA: 4 de 10

Dotación unidad medicina nuclear de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 1.000	\$ 1.000		\$ -
Renovación de un Angiógrafo Para la unidad CARDIOVASCULAR, cofinanciado con recursos de Minsalud - Recursos Propios	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 4.616.971.415	\$ 1.200.000.000	\$ 3.416.971.415	\$ 4.462.976.000
TOTAL		\$ 85.099.255.591	\$ 25.973.318.918	\$ 58.602.593.365	\$ 84.543.575.659,58

A continuación, se presenta grafica de ejecución presupuestal Plan Operativo Anual de Inversiones vigencia 2024:

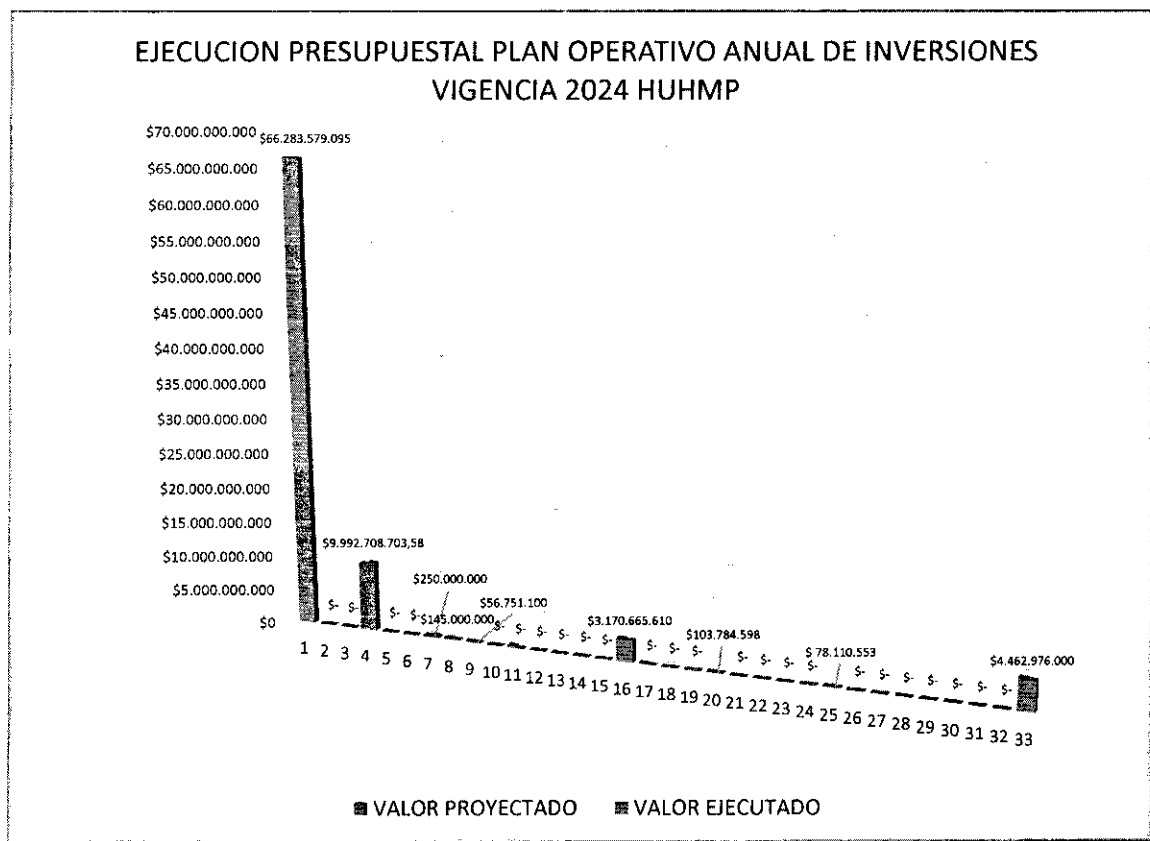

Fuente: Elaboración propia

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Linea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 5 de 10

Mediante correo electrónico de fecha 14 de enero de 2025 detalla los avances en la ejecución de los proyectos de inversión a cargo de la Subgerencia Administrativa, los cuales presentan a continuación:

1. Proyecto **“Construcción de la Terminación de la Torre Materno Infantil y de Alta Complejidad de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva Departamento del Huila.”**, por valor de **\$66.282.000.000**:

- Se suscribió Contrato de Obra No. 119 del 07 de marzo de 2024, con Consorcio Construcción Materno, inicio el 09 de mayo de 2024, por valor de **\$62.845.147.244 IVA incluido**, con el objeto de Construcción de la Terminación de la Torre Materno Infantil y de alta complejidad de la ESE, se encuentra en ejecución con un avance de obra a 24 de diciembre del **29,41%**.
- Se suscribió Contrato de Interventoría No. 146 del 25 de marzo de 2024, con Unión Temporal Inter TMI, inicio el 09 de mayo de 2024, por valor de **\$3.332.431.851**, con el objeto de Interventoría al contrato que se suscriba para la obra construcción y terminación de la Torre Materno Infantil y de alta complejidad de la ESE. Se encuentra en ejecución.
- Se suscribió el Contrato de consultoría No. 165 de 2024, con VINCI PROJECTS SAS, con el objeto de Consultoría para el apoyo a la supervisión técnica al contrato de obra No. 119 de 2024 suscrito para la construcción de la terminación de la torre materno infantil y de alta complejidad de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, por valor de **\$98.000.000**. Se encuentra en ejecución.
- Se suscribió Orden de Servicio 439-2024 por valor de **\$8.000.000**, para la impresión de planos, fotoplanos, escaneo, ploteo, digitalización de planos de la E.S.E.

Por lo anterior el porcentaje de ejecución de este proyecto, de acuerdo al compromiso del rubro de inversión corresponde a un **100%**.

2. Proyecto **“Construcción de la unidad de medicina nuclear de la E.S.E H.U.H.M.P Departamento del Huila.”**, se encuentra sin iniciar, por lo tanto, la ejecución de este proyecto es de **0%**.

3. Proyecto **“Construcción de la unidad neuropsiquiátrica y del comportamiento de la E.S.E hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.”** Se encuentra pendiente de revisar y hacer actualización del proyecto que está aprobado desde el 2018. Se está a la espera de recibir el estudio de patología estructural del edificio de la unidad mental de la ESE., la ejecución de este proyecto es de **0%**.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita: 018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 6 de 10

4. Proyecto “Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva”, proyectado por valor de \$9.766.501.087:

- Se suscribió el Contrato de Obra No. 164 de 2024 para la Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias de la ESE, por valor de **\$9.480.335.068,58**. Inició el 14 de mayo de 2024. A 31 de diciembre de 2024 el avance de obra es de **67,77%**. El contrato se encuentra en ejecución. Se pagaron cinco actas.
- Se suscribió el Contrato de Interventoría No. 166 de 2024 para la interventoría al contrato que se suscriba para la ampliación y remodelación del servicio de urgencias, por valor de **\$512.373.635**. Con acta de inicio del 14 de mayo de 2024. Se encuentra en ejecución.

Por lo anterior el porcentaje de ejecución de este proyecto, de acuerdo al compromiso del rubro de inversión corresponde a un **102%**.

5. Proyecto “**Adquisición lote para edificio de parqueaderos**”, se encuentra sin iniciar. Se contrató el avalúo del lote denominado Cirugía Plástica, donde se tiene proyectado construir el parqueadero., la ejecución del proyecto se encuentra en **0%**.

6. Proyecto “**Construcción de bodega de archivo**”, se encuentra sin iniciar, por consiguiente, la ejecución del proyecto se encuentra en **0%**.

7. Proyecto “**Diseño de sistema detección de incendios**”, con valor presupuestado en POAI de \$170.000.000, se suscribió el contrato de Consultoría No. 163 de 2024, con Building to live S.A.S por valor de **\$250.000.000**, con el objeto de “Consultoría para la elaboración del diagnóstico, diseño y presupuesto del sistema de equipos para detección y alarma de incendios de la torre principal, módulo tres y demás áreas de la ESE, así como el sistema de extinción de incendios para las áreas de cancerología, áreas de expansión, bodega, gases medicinales, administración, y demás áreas que no posean dicho diseño de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva”, lo que representa en la ejecución presupuestal de **147%** frente a lo planeado. Proyecto ejecutado 100%.

8. Proyecto “**Estudio de patología del área de Unidad Mental**”, con valor presupuestado en POAI de \$231.000.000, se suscribió el Contrato de Consultoría No. 168 de 2024, con el objeto “Consultoría para el estudio de patología estructural del edificio de la Unidad Mental de la ESE”, por valor de **\$145.000.000 IVA incluido**, lo que representa en la ejecución presupuestal de **63%** frente a lo planeado. Contrato ejecutado 100%, entregaron todos entregables contratados. El contrato terminado el 26 de agosto de 2024.

9. Proyecto “**Estudio del catastro de redes del sistema de oxígeno y aire medicinal**”, con valor presupuestado en POAI de \$100.000.000, se suscribió Contrato No. 269 de 2024 con HR EQUIPOS & MONTAJES S.A.S Cuyo objeto es “Prestación de servicios de apoyo en el levantamiento planimétrico y diagnóstico de las redes de gases medicinales y vacío de la torre

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita: 018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 7 de 10

principal, áreas de salud mental y oncología de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva", lo que representa en la ejecución presupuestal de **57%** frente a lo planeado. Se ejecutó 100%, pendiente de pago.

10. Proyecto "**Construcción de central de esterilización**", se encuentra sin iniciar, se cuenta con un proyecto de años anteriores, se debe ajustar técnicamente y actualizar precios. por lo tanto, la ejecución del proyecto se encuentra en **0%**.

11. Proyecto "**Adecuación de sala Angiógrafo, salas de recuperación y hall de acceso**", fue ejecutado con recursos del contrato de mantenimiento de la infraestructura de la ESE, por rubro de mantenimiento, la ejecución del proyecto se encuentra en **0%**.

12. Proyecto "**Construcción de la red de detección y extinción de incendios del sistema de emergencias de la E.S.E Hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva**", se encuentra sin iniciar, por lo tanto, la ejecución del proyecto se encuentra en **0%**.

13. Proyecto "**Construcción de bodega de activos fijos**", se encuentra sin iniciar, por lo tanto, la ejecución del proyecto se encuentra en **0%**.

14. Proyecto "**Diseño de sede para consulta externa (25 consultorios)**", encuentra sin iniciar, por ende, el porcentaje de ejecución es del **0%**.

15. Proyecto "**Adecuación sala de espera primer piso, diseño y construcción de estructura en área de capilla dándole manejo a redes hidrosanitarias y eléctricas**", proyecto está sin iniciar, por lo cual, su ejecución es del **0%**.

16. Proyecto "**Reforzamiento estructural módulo 3**", por valor de **\$3.318.073.733**:

- Se suscribió el Contrato de Obra No. 194 de 2024, con Unión Temporal Reforzamiento Hospital, con el objeto de Construcción y Reforzamiento Estructural del Módulo 3 de la ESE., por valor de **\$2.944.257.252**. Contrato iniciado el 04 de julio de 2024, se suspendió el 25 de julio de 2024 y se reinició el 25 de septiembre de 2024 con terminación al 03 de mayo de 2025, se encuentra en ejecución. Se canceló anticipo y primer pago. A 31 de diciembre de 2024 se ejecutó **15,81%**.
- Con el objeto de contratar la interventoría al contrato que se suscriba para la obra construcción y reforzamiento estructural del módulo 3 de la ESE, por valor de **\$226.408.358**. Contrato iniciado el 04 de julio de 2024, se suspendió el 25 de julio de 2024 y se reinició el 25 de septiembre de 2024 con terminación al 03 de mayo de 2025, se encuentra en ejecución.

A corte de 31 de diciembre de 2024, dicho proyecto tiene una ejecución, de acuerdo al compromiso del rubro de inversión del **96%**.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita: 018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 8 de 10

17. Proyecto **“Dotación de equipo industrial o comercial para acondicionamiento de aire y calefacción”**, se encuentra en **0%**, toda vez que dicho proyecto se encuentra sin iniciar.

18. Proyecto **“Adquisición y reposición de equipos biomédicos necesarios para la E.S.E para el cumplimiento al sistema único de habilitación”** por valor de **\$ 122.523.002**:

- Se suscribió el Contrato de Compraventa No. 143 de 2024, con Fleming Biomedica SAS, con el objeto de la compra de camillas de transporte y atriles portabomba para la ESE, por valor de \$199.592.417 de los cuales por el rubro de inversión se comprometieron \$17.868.350.
- Se suscribió la Orden No. 00000130, con Subiecom LTDA, para la Compra de un agitador de mazzini para la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.
- Se suscribió orden de compra de activo fija No.00000136, con Sanitas S.A.S para la compra de una central de inclusión para el servicio de patología de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.

A corte de 31 de diciembre de 2024 la ejecución del proyecto, de acuerdo al compromiso del rubro de inversión corresponde al **64%**.

19. Proyecto **“Dotación de equipos biomédicos de alta tecnología para la unidad de cuidado intensivo neonatal del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva”**, se unificó con el proyecto de dotación de equipos biomédicos de la Torre Materno Infantil, se cuenta con listado de equipos y especificaciones técnicas ya revisadas por Minsalud en la mesa técnica realizada el 3 de diciembre de 2024, por tal razón su ejecución es del 0%.

20. Proyecto **“Dotación de equipos biomédicos de alta tecnología para el servicio de urgencias de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva”**, se realizó mesa técnica con MINSALUD con el fin de validar las especificaciones técnicas y el presupuesto de los equipos en los meses de octubre y noviembre. Una vez se verifica la información se procede a radicar ante secretaria de Salud departamental quien dio viabilidad al proyecto y posteriormente en el mes de diciembre se radica al Ministerio de Salud y Protección social, por tal razón su ejecución es del 0%.

21. Proyecto **“Dotación de equipos de apoyo para la central de esterilización del Hospital”**, el Ministerio lo devuelve, para que primero se adecue el área, ejecución del 0%.

22. Proyecto **“Dotación de equipos biomédicos para la torre materno infantil de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva”**, se realizó mesa técnica con MinSalud el día 3 de diciembre, para revisión de especificaciones técnicas de los equipos, se realizaron algunas recomendaciones. Para la vigencia 2025 se estima el inicio de realizar la solicitud de cotizaciones., su ejecución a 31 de diciembre de 2024 es del 0%.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 9 de 10

23. Proyecto "Dotación de equipos biomédicos para terapia ECMO en la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva", sin iniciar, ejecución del 0%.

24. Proyecto "Adquisición de gamma cámara para la unidad oncológica de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva", se encuentra sin iniciar, ejecución del 0%.

25. Proyecto "Dotación unidad medicina nuclear de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva", se encuentra sin iniciar, ejecución del 0%.

26. Proyecto "Renovación de un Angiógrafo Para la unidad CARDIOVASCULAR, cofinanciado con recursos de Minsalud - Recursos Propios", Se suscribió Contrato No. 091 de 2024 del 15 de febrero de 2024 por valor de \$4.462.976.000, con el objeto de adquisición de un Angiógrafo para renovación tecnológica de la ESE. Se recibió el equipo el 18 de septiembre de 2024, se realizó la instalación del equipo, y se están realizando las pruebas y la calibración del sistema operativo del equipo y a la par se están tramitando las licencias de funcionamiento del equipo, por lo tanto, el porcentaje de ejecución de este proyecto, de acuerdo al compromiso del rubro de inversión corresponde al 97%.

En cuanto a la ejecución de los proyectos a cargo de la Ing. Adriana María Lizcano Losada – Jefe de Oficina Asesora de Sistemas de Información, mediante correo electrónico de fecha 30 de diciembre de 2024, informa:

27. Proyecto "Dotación de centro de datos para E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva con estándares de alta disponibilidad, escalamiento y mejoramiento de los servicios tic, fase IV" – EQUIPO INDUSTRIAL O COMERCIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y CALEFACCIÓN", ejecución del 0%, proyecto sin iniciar.

28. Proyecto "Dotación de centro de datos para ese Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva con estándares de alta disponibilidad, escalamiento y mejoramiento de los servicios tic, fase IV." EQUIPOS Y MÁQUINAS PARA TELEPROCESOS", ejecución del 0%, proyecto sin iniciar.

29. Proyecto "Dotación de equipos y máquinas para teleprocesos", se suscribió Orden de compra No. OC00000142 por valor de \$103.784.598 con Big Data Soluciones Integrales S.A.S., adquisición de 13 computadores portátiles, de acuerdo al compromiso del rubro de inversión corresponde al 96%.

30. Proyecto "Adquisición de infraestructura tecnológica para control y seguimiento de acceso a los usuarios y personal que labora en las instalaciones de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva", ejecución del 0%.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita: 018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
	INFORME	VERSIÓN: 02
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 10 de 10

31. Proyecto “Desarrollo a la medida de un software (análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y soporte) para los sistemas core (his, erp) en una plataforma de microservicios y contenedores para la E.S.E HUHMP, dpto. del Huila, fase II: historia clínica, gestión de procesos de negocio (bpm)”, plataforma tecnológica”, ejecución del 0%.

32. Proyecto “Adquisición de Paquetes de Software”, ejecución del 0%.

33. Proyecto “Dotación de centro de datos para ese hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva con estándares de alta disponibilidad, escalamiento y mejoramiento de los servicios tic, fase IV”. APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO”, ejecución del 0%.

CONCLUSIONES:

Frente a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión de la Institución, encontramos que, con corte a 31 de diciembre de 2024, se presenta ejecución de los compromisos en el presupuesto de inversión por valor de **\$84.543.575.659,58** millones, correspondiente al **99.3%** del presupuesto aprobado el Plan Operativo Anual de Inversión 2024.

RECOMENDACIONES:

Se solicita a los ejecutores del POAI informar a la Oficina Asesora de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional y la Oficina de Presupuesto, notificar cualquier trámite o modificación que se requiera realizar al rubro gastos de inversión.

Se sugiere fortalecer la priorización de los proyectos y la asignación de los recursos que quedan incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI para futuras vigencias, ya que para el año 2024 se incluyeron 22 iniciativas que no presentaron avance en su gestión y ejecución.



MARLENY QUESADA LOSADA

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.

Proyecto: Ana María Peña Gutiérrez-Profesional Especializada participe de gremio. *al*

Revisó: Marleny Quesada Losada jefe Oficina de planeación, Calidad y Desarrollo Institucional.

Anexos: (Acuerdo 0002 del 31 de enero de 2023)

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita: 018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia
